



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministarstvo za Regionalni Razvoj
Ministry of Regional Developme

Departamenti i Zhvillimit Rajonal

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MZHR në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2021**

Janar, 2022

Përmbajtja

| | |
|--|----|
| Hyrje..... | 3 |
| Përmbledhja ekzekutive | 4 |
| Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve..... | 4 |
| SHTIME | 5 |
| "Rregullimi i parkut atraktiv dhe sportiv te pishat ne Shtime-Faza II" | 5 |
| KLINË | 6 |
| " Ndërtimi i ujësjellësit në Gllarevë " | 6 |
| PODUJEVË | 7 |
| " Ndërtimi i Urave - Fshati Bajqinë, fshati Gllamnik dhe fshati Sfeqël " | 7 |
| FERIZAJ | 8 |
| " Ndërtimi I infrastrukturës në zona turistike - Parku I Pishave" | 8 |
| KAÇANIK | 9 |
| " Asfaltimi i rrugës Ramadan Xhokli f. Koxhaj" | 9 |
| SKENDERAJ | 10 |
| " Ndërtimi i çerdhes për fëmijë faza - II " | 10 |
| VUSHTRRI | 11 |
| " Ndërtimi I rrugës se rendit të katërt me zhavor në Fshatin Skoqen, Asfaltimi I rrugës në fshatin Taraxhë - Bruznik, Asfaltimi I rrugës në fshatin Samadrexhë - Dumnicë " | 11 |
| MITROVICË | 12 |
| "Ndërtimi dhe asfaltimi I rrugëve në fshatin Kutllovc " | 12 |
| HANI ELEZIT | 13 |
| "Shtrimi me kubeza betoni I rrugëve ne zona rurale - Komuna Hani Elezit" | 13 |
| GJAKOVË..... | 14 |
| "Ndërtimi i urës për Këmbësor dhe B biçikleta mbi Lumin Erenik " | 14 |
| MAMUSHË | 15 |
| "Ndërtimi dhe shtrimi i rrugëve lokale me kubëza në Mamushë" | 15 |
| PRIZREN | 16 |
| "PUMPTRUCK" | 16 |
| RAHOVEC | 17 |
| "Ndërtimi i tregut ditor ne fshatin Ratkoc - Rahovec" | 17 |
| ZVEÇAN..... | 18 |
| " Asfaltimi i rrugës kryesore dhe rrugëve hyrëse dhe ndërtimi i mureve mbajtës të betonit të armiruar në vendbanim meme Zvecan " | 18 |
| KAMENICË..... | 19 |
| "Zhvillimi Socio-Ekonomik ne komunen e Kamenices - Kanalizimi " | 19 |

Hyrje

Ministria e Zhvillimit Rajonal bazuar në mandatin e saj ka për qëllim që të zhvillon dhe menaxhon projekte për të ofruar zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Programi për Zhvillimi Rajonal ka për qëllim të kontribuojë në krijimin e kushteve për zhvillimin ekonomik rajonal të qëndrueshëm në të gjitha rajonet ekonomike të Kosovës dhe për të promovuar zhvillimin socio-ekonomik, mjedisor dhe kulturor të balancuar.

Raporti i përgatitur, paraqet investimet publike që ka bërë Ministria e Zhvillimit Rajonal gjatë vitit 2021 për komuna, ku përmes këtij Programi ju është mundësuar komunave për të zhvilluar më tej rolin e tyre udhëheqës në përmirësimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal përmes një projekti që kontribuon në një apo më shumë prioritete të listuara në Strategjitë e tyre për Zhvillimit lokal/Rajonal.

Këto investime kanë përfshirë të gjithë sektorët si: rrugë, ujësjellës, kanalizime, kulturë rini dhe sport, shërbime publike, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e burimeve njerëzore .

Ministria e Zhvillimit Rajonal do të vazhdoj edhe në të ardhmen që të përkrah zhvillimin rajonal të balancuar në tërë Republikën e Kosovës.


Përmbledhja ekzekutive


Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

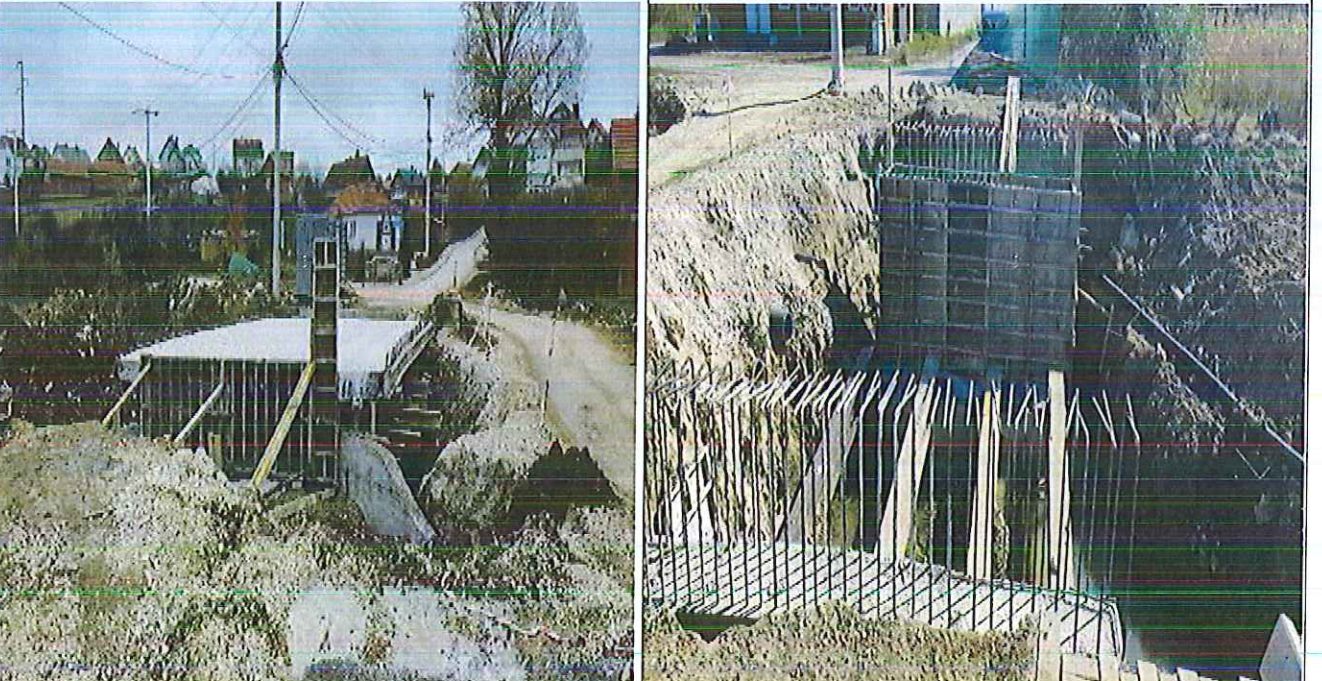
Ky raport është i detajuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MZHR-së në shumë projekte. MZHR në vitin 2021 gjithsej ka realizuar 15 projekte në 15 komuna të Republikës së Kosovës.

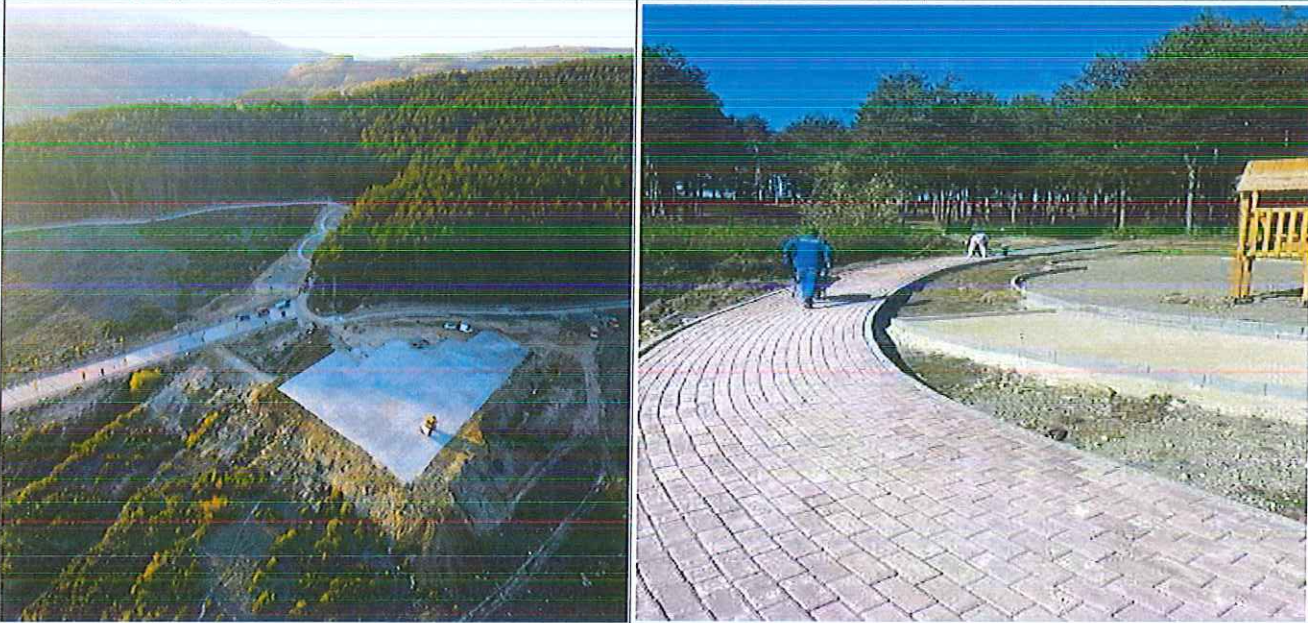
Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve


Ministria e Zhvillimit Rajonal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e projekteve e ka implementuar nga Divizioni për Menaxhim dhe Zhvillim të Projekteve si dhe nga shërbimet e kontraktuara të mbikëqyrjes.

| | | |
|--|---|--|
| Komuna | SHTIME | |
| Titulli i projektit | "Rregullimi i parkut atraktiv dhe sportiv te pishat ne Shtime-Faza II" | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, pastrimi i stazave, vendosja e skajoreve, vendosja e asfaltit, rrasave, montimi ulëseve dhe shportave nga metali. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Shtimes. | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 20,000.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 13.07.2021 – 52,647.90 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | AFRIM M. SALIHU B.I | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 50,000.00 € | |
|  | | |

| | | |
|---|---|--|
| Komuna | KLINË | |
| Titulli i projektit | " Ndërtimi i ujësjellësit në Gllarevë " | |
| Përshkrimi projektit | Gërmimi i kanalit të ujësjellësit, planifikimi i fundit të kanalit, vendosja e rërës në fundin e kanalit, shpimi i rrugës, furnizimi me gypa të ujësjellësit, instalimi dhe mbulimi dhe planifikimi i kanalit të gërmuar. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Klinës. | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 70,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 40,000.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 12.08.2021 - 99,953.70 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | Infra Plus Shpk | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 70,000.00 € | |
|  | | |


| | | |
|---|---|--|
| Komuna | PODUJEVË | |
| Titulli i projektit | " Ndërtimi i Urave - Fshati Bajqinë, fshati Gllamnik dhe fshati Sfeqël " | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Ndërtimi i kantierit, pastrimi i terrenit, demolimi i urës ekzistuese, furnizimi, transporti me materialet, gjurmimi i dheut, betonimi i shtresës, prerja lakimi dhe vendosja e armaturës sipas detaleve në projekt. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Podujevës. | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 60,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 42,640.91 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 27.07.2021 - 65 635,23€ | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | I & B - Group SH.P.K. BRT SH.P.K | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 18,791.21 € | |
|  | | |


| | | |
|---|--|--|
| Komuna | FERIZAJ | |
| Titulli i projektit | " Ndërtimi I infrastrukturës në zona turistike - Parku I Pishave" | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, pastrimi i stazave, vendosja e skajoreve, vendosja e zhavorit, rrasave, montimi ulëseve, tavolinave statike dhe shportave. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Ferizajit. | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 25,158.40 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 01.07.2021 – 64,236.40 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | "BERISHA COMPANY" SHA | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 15,000.00 € | |
|  | | |


| | | |
|---|---|--|
| Komuna | KAÇANIK | |
| Titulli i projektit | "Asfaltimi i rrugës Ramadan Xhokli f. Koxhaj" | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, ngjeshja e nën bazës së trotuarit, furnizimi me material mbushës, montimi i kabëzave, furnizim i anësoreve dhe vendosja e tyre. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Kaçanikut | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 147,646.40 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 18.06.2021 - 114,755.20 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | "Euro TRANS" SHPK | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 50,000.00 € | |
|  | | |

| | | |
|--|---|--|
| Komuna | SKENDERAJ | |
| Titulli i projektit | " Ndërtimi i çerdhes për fëmijë faza - II " | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, furnizimi me beton, furnizimi dhe vendosja e armaturës, punimi i hidroizolimit dhe vendosja e konstruksioneve metalike. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Skenderajt | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 15.09.2021 | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 130,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 20,000.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 28.07.2021 - 163,467.17 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | N.N.P. WENDA | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 49,372.70 € | |



| | | |
|---|--|--|
| Komuna | VUSHTRRI | |
| Titulli i projektit | " Ndërtimi I rrugës se rendit të katërt me zhavor në Fshatin Skoqen, Asfaltimi I rrugës në fshatin Taraxhë - Bruznic, Asfaltimi I rrugës në fshatin Samadrexhë - Dumnicë " | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, pastrimi i terrenit dhe vendosja e asfalt betonit | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Vushtrris | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 70,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 50,000.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 02.06.2021 - 120,000.00 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | Bageri SHPK & Berisha Group SHPK | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 43,825.00 € | |
|  | | |

| | | |
|--|--|--|
| Komuna | MITROVICË | |
| Titulli i projektit | "Ndërtimi dhe asfaltimi I rrugëve në fshatin Kutllovc " | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Shënimi i trasesë, gërmimi i dheut, rrafshimi i nën bazës, punimi i tamponit, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit. | |
| Outputet/ Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Mitrovicës | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 61,673.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 15.07.2021 - 107,496.00 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | Bujar Shabani BI | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 50,000.00 € | |
|  | | |

| | | |
|--|--|--|
| Komuna | HANI ELEZIT | |
| Titulli i projektit | "Shtrimi me kubeza betoni I rrugeve ne zona rurale - Komuna Hani Elezit" | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, pastrimi i terrenit, vendosja e skajoreve, furnizimi dhe vendosja e pllakave (kabëzave). | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Hani Elezit | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 9,928.90 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 31.08.2021 – 80,016.25 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | Kema Company SHPK | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 50,000.00 € | |
|  | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Komuna | GJAKOVË |
| Titulli i projektit | “Ndërtimi i urës për Këmbësor dhe Bëçikleta mbi Lumin Erenik “ |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, furnizimi më material guror, beton, furnizimi me beton joulëshues furnizimi dhe vendosja e armaturës. |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Gjakovës. |

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

| | |
|--|------------------------------|
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 10.03.2021 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 92,510.45 € gjatë vitit 2021 |


Kontrata


| | |
|--|--------------------------|
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 06.10.2021- 117,334.07 € |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | |
| Emri i Kontraktuesit | Roza Komani BI |


Pagesat

| | |
|---------------------------|-------------|
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 49,999.99 € |
|---------------------------|-------------|



| | | |
|---|--|--|
| Komuna | MAMUSHË | |
| Titulli i projektit | "Ndërtimi dhe shtrimi i rrugëve lokale me kubëza në Mamushë" | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Identifikimi i instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore, gërmimi i dheut, pastrimi i terrenit, vendosja e skajoreve, furnizimi dhe vendosja e pllakave (kabëzave). | |
| Outputet/ Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Hani i Gjakovës | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 5,000.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 20.10.2021 - 42,150.94 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | FLORI SH.P.K | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 42,150.94 € | |
|  | | |

| | | |
|---|--|--|
| Komuna | PRIZREN | |
| Titulli i projektit | "PUMPTRUCK" | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Zhvillimi i vizualizimit 3D, gërmimi, furnizime me materiale të gurit dhe humusit, vendosja e shtyllës në mes të stazës, shtrirja e shtresës së asfaltit. | |
| Outputet/ Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Prizrenit | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 22.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 40,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 31,510.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 03.06.2021 - 67,067.00 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | "LIMIT L&B" SHPK | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 40,000.00 € | |
|  | | |

| | | |
|---|--|--|
| Komuna | RAHOVEC | |
| Titulli i projektit | "Ndërtimi i tregut ditor ne fshatin Ratkoc - Rahovec" | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, furnizimi, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese, betonimi, vendosja e kubëzave, vendosja e skajoreve, vendosja e rrethojës dhe ndërtimi i objektit sanitar. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Rahovecit | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 26,830.00 € në vitin 2021 | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 18.06.2021 – 69,996.98 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | Tahir Bugari BI | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 50,000.00 € | |
|  | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Komuna | ZVEÇAN |
| Titulli i projektit | "Asfaltimi i rrugës kryesore dhe rrugëve hyrëse dhe ndërtimi i mureve mbajtës të betonit të armiruar në vendbanim meme Zvecan " |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Vendosja e zhavorit dhe ngjeshja, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit |
| Outputet/ Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Zveçanit |

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

| | |
|--|--------------------------|
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 09.03.2021 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 50,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 7,300.00 € në vitin 2021 |


Kontrata

| | |
|--|--------------------------|
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 27.05.2021 - 72,641.50 € |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | |
| Emri i Kontraktuesit | Radovan Radic BI |

Pagesat

| | |
|---------------------------|-------------|
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 49,994.60 € |
|---------------------------|-------------|



| | | |
|---|---|--|
| Komuna | KAMENICË | |
| Titulli i projektit | "Zhvillimi Socio-Ekonomik ne komunen e Kamenices - Kanalizimi " | |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut, planifikimi i fundit të kanalit, vendosja e rërës në fundin e kanalit, furnizimi me gypa, instalimi dhe mbulimi dhe planifikimi i kanalit të gërmuar. | |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Kamenicës. | |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 02.06.2020 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | 17.03.2021 | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | 40,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | 29,997.98 € | |
| Kontrata | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | 08.12.2021 – 124,305.33 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |
| Emri i Kontraktuesit | El Bau SHPK | |
| Pagesat | | |
| Vlerat e pagesës nga MZHR | 69,998.68 € | |
|  | | |
